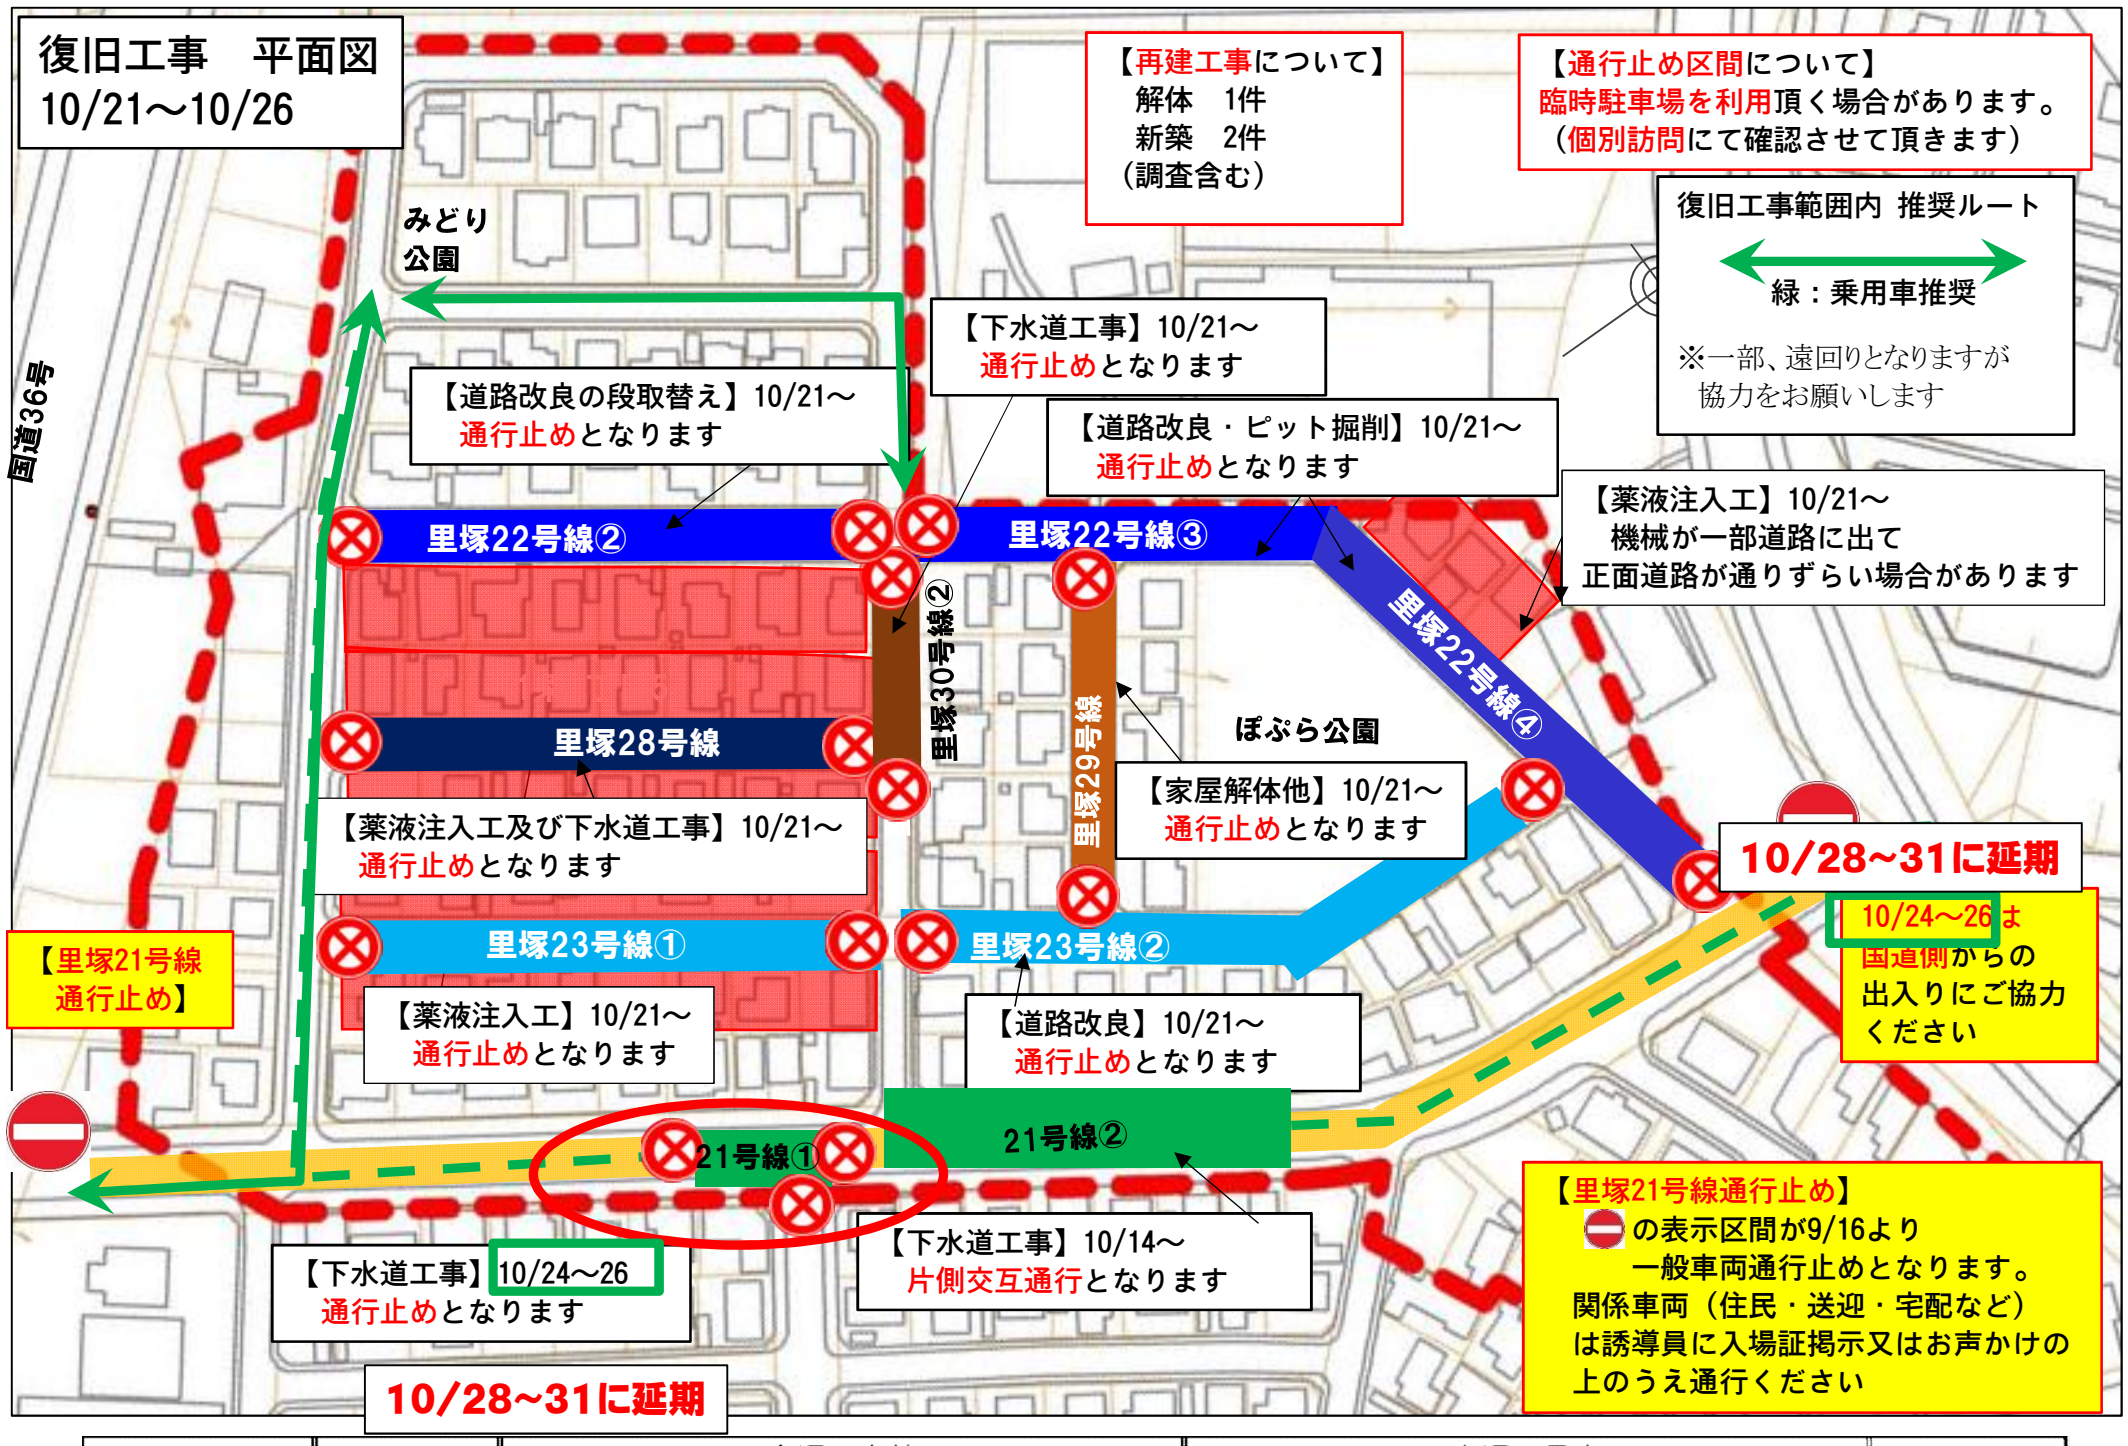

週間工程表

工事名	担当業者	今週の実績 14日（月）	15日（火）	16日（水）	17日（木）	18日（金）	19日（土）	20日（日）	来週の予定 21日（月）	22日（火）	23日（水）	24日（木）	25日（金）	26日（土）	27日（日）	備考
21号線①,②	北土建設㈱	片付け														
	㈱北英建設	下水道 敷設替え							下水道 敷設替え							
	北海道ロード建設(株)											下水管敷設				
22号線①	五洋・伊藤JV	暗渠掘削														
22号線②	五洋・伊藤JV	道路部　地盤改良							段取替え							
22号線③	五洋・伊藤JV	ピット掘削							道路部 地盤改良							
22号線④									ピット掘削							
23号線①	五洋・伊藤JV	宅地部　薬液注入工							宅地部　薬液注入工							
23号線②	五洋・伊藤JV	道路部　地盤改良							道路部　地盤改良							
28号線	五洋・伊藤JV	宅地部　薬液注入工							宅地部　薬液注入工							
	㈱北英建設		下水道敷設替え													
29号線	五洋・伊藤JV	家屋解体工事							家屋解体工事							
30号線②	㈱北英建設	掘削補助改良			ライナー掘削				ライナー掘削							

通行止め
片側交互通行
通抜け不可
（宅地進入は可）

10/28~31に延期

●里塚復旧工事通信　事務局
清田区平岡1条4丁目4番地（五洋・伊藤JV　工事事務所内）
